

連續壁施工品質自檢總表

工程名稱： Example Construction Project ...
施工廠商： ○○營造股份有限公司

施工期間： 2026-08-10 ~ 2026-08-11
填表人： Site Engineer



壁體資訊

單元類型 公單元	軸線 / 方向編號 21	順序編號 03
混凝土強度(kgf/cm²) 350	設計深度(GL,m) GL -35.80 m	壁厚 / 單元長度(m) 1.00 / 2.80
澆置頂端高程(GL,m) GL -0.50	設計澆置高度(m) 35.30	設計 / 實際數量(m³) 98.84 / 107.46

檢查項目

項目	判定標準	數值	單位
混凝土坍度	坍度 18 cm	18	cm
坍度允許誤差	允許誤差 2 cm	2	cm
沉泥厚度上限	沉泥厚度 ≤ 10 cm	10	cm
含砂量上限	含砂量 ≤ 1%	1	%
靜置時間下限	靜置時間 ≥ 0.5 hr	0.5	hr
垂直精度 (10 / D)	垂直壁體偏差 ≤ 1/300	300	1/n
特密管端距上限	特密管端距 ≤ 20 cm	20	cm
公單元埋入深度下限	1.5	1.5	m
澆置中斷時間上限	澆置中斷 ≤ 30 min	30	min
澆置完成時間上限	澆置完成 ≤ 90 min	90	min
氯離子含量上限	氯離子含量 ≤ 0.15 kg/m³	0.15	kg/m³
導溝中心線偏差上限	中心線偏差 ≤ 2 cm	2	cm
壁厚偏差上限	壁厚偏差 ≤ 5 cm	5	cm
鋼筋籠縱向偏差上限	縱向偏差 ±7.5 cm	±7.5	cm
鋼筋籠頂高程偏差上限	頂高程偏差 ±5 cm	±5	cm
保護層厚度下限	保護層厚度 ≥ 7.5 cm	7.5	cm
實際 / 設計數量差異上限	實際 / 設計數量差異 ≤ 10%	10	%

品質自檢項目

項次	檢查項目	檢查標準	現場紀錄 / 實測	結果
1	連續壁單元位置、刀法順序確認	中心線偏差 ≤ 2 cm	已確認	符合
2	底部沉渣及泥屑清除確認	沉泥厚度 ≤ 10 cm	已確認	符合
3	端板接頭清洗 (公及公母單元時)	以大小鋼刷確實清洗	已確認	符合
4	穩定液新鮮液之貯存量是否充裕	依照施工計畫	已確認	符合
5	槽溝穩定液面高度控制	鋪面下 50 cm~100 cm 以內	已確認	符合
6	廢土清運是否正常	不致影響挖掘進度	已確認	符合
7	施工動線及運土車輛之安排	不致延遲澆置時間	已確認	符合
8	壁體坍塌處是否需作補強	若需補強，說明方式	已確認	符合
9	帆布是否破損 (母單元時)	單元起吊前及下放時檢查	已確認	符合
10	開挖深度與特密管長度之配合	特密管端距 ≤ 20 cm	已確認	符合
11	特密管之檢查 (變形、破裂、堵塞、水密性)	下放前及過程中目視檢查	已確認	符合
12	特密管插入位置、深度、組合記錄	位置符合圖面；長度配合挖掘深度	已確認	符合
13	放置橡皮碗	澆置前放置於漏斗內	已確認	符合
14	穩定液回收池容積是否足夠	同時間無挖掘，容積大於回收量	已確認	符合

連續壁施工品質自檢總表

工程名稱： Example Construction Project ...
施工廠商： ○○營造股份有限公司
施工期間： 2026-08-10 ~ 2026-08-11
填表人： Site Engineer



品質自檢項目（續）				
項次	檢查項目	檢查標準	現場紀錄 / 實測	結果
15	混凝土坍度之確認	坍度 18 cm；允許誤差 2 cm	已確認	符合
16	混凝土是否合乎設計強度	記錄空打段、實打段 GL 與強度	已確認	符合
17	特密管埋入混凝土內之確認	公單元：1.5	已確認	符合
18	超音波記錄結果說明	依單元型式及圖說完成檢測記錄	已確認	符合

缺失及改善結果				
各項檢查完成，未發現影響施工之缺失。				

所長	副所長	擔當者

開挖與前置紀錄

工程名稱：Example Construction Project ...
施工廠商：〇〇營造股份有限公司

開挖日期：2026-08-10 ~ 2026-08-11
填表人：Site Engineer



壁體資訊

單元類型 公單元	軸線 / 方向編號 21	順序編號 03
混凝土強度(kgf/cm ²) 350	設計深度(GL,m) GL -35.80 m	壁厚 / 單元長度(m) 1.00 / 2.80
澆置頂端高程(GL,m) GL -0.50	設計澆置高度(m) 35.30	設計 / 實際數量(m³) 98.84 / 107.46

04 | 開挖紀錄開挖日期：2026-08-10 ~ 2026-08-11

出土次數 3 次	深度確認 2 次	最新深度 -35.82 m	與設計差異 -0.02 m
-------------	-------------	------------------	------------------

出土紀錄	
次數	出土時間
1	07:40
2	08:20
3	09:05

深度確認			
次數	確認時間	深度 (m)	與設計差異 (m)
1	12:10	-35.80	0.00
2	12:35	-35.82	-0.02

05 前置紀錄時間紀錄				
項次	作業項目	作業日期	開始時間	完成時間
1	清沉泥	2026-08-11	08:00	08:30
2	下方鋼筋籠吊放	2026-08-11	09:00	09:30
3	上方鋼筋籠吊放	2026-08-11	10:00	
4	鋼筋籠續接	2026-08-11	11:00	11:30
5	鋼筋籠吊放完成	2026-08-11		12:30
6	特密管施工	2026-08-11	13:00	13:30

跨午夜的時間以 24 時以後接續表示（例：24:20＝翌日 00:20）。

所長	副所長	擔當者

澆置紀錄

工程名稱：Example Construction Project — North Lot

澆置日期：2026-08-11

施工廠商：○○營造股份有限公司

填表人：Site Engineer

壁體資訊

單元類型	軸線 / 方向編號	順序編號	混凝土強度(kgf/cm²)	設計深度(GL,m)	壁厚 / 單元長度(m)	澆置頂端高程(GL,m)	設計澆置高度(m)	設計 / 實際數量(m³)
公單元	21	03	350	GL -35.80 m	1.00 / 2.80	GL -0.50	35.30	98.84 / 107.46


澆置主控摘要

車次(車)	逐車累積量(m³)	設計 / 實際數量(m³)	預估 / 實測 / 差異(m)
8	93.46	98.84 / 107.46	33.38 / 32.60 / -0.78

逐車混凝土澆置紀錄

車次	車號	出廠	卸料	結束	坍度(cm)	方量(m³)	累積(m³)	預估高(m)	實際高(m)	澆置時間(分)
1	C01	12:28	13:20	13:33	(試1) 18	12.00	12.00	4.29	3.90	65
2	C02	12:50	13:42	13:55		12.00	24.00	8.57	8.00	65
3	C03	13:28	14:20	14:33		12.00	36.00	12.86	12.10	65
4	C04	13:50	14:42	14:55		12.00	48.00	17.14	16.20	65
5	C05	14:28	15:20	15:33		12.00	60.00	21.43	20.30	65
6	C06	14:50	15:42	15:55		12.00	72.00	25.71	24.40	65
7	C07	15:28	16:20	16:33		12.00	84.00	30.00	28.50	65
8	C08	15:50	16:42	16:55		9.46	93.46	33.38	32.60	65

跨午夜的時間以 24 時以後接續表示 (例：25:30＝翌日 01:30)；澆置時間＝結束 - 出廠。

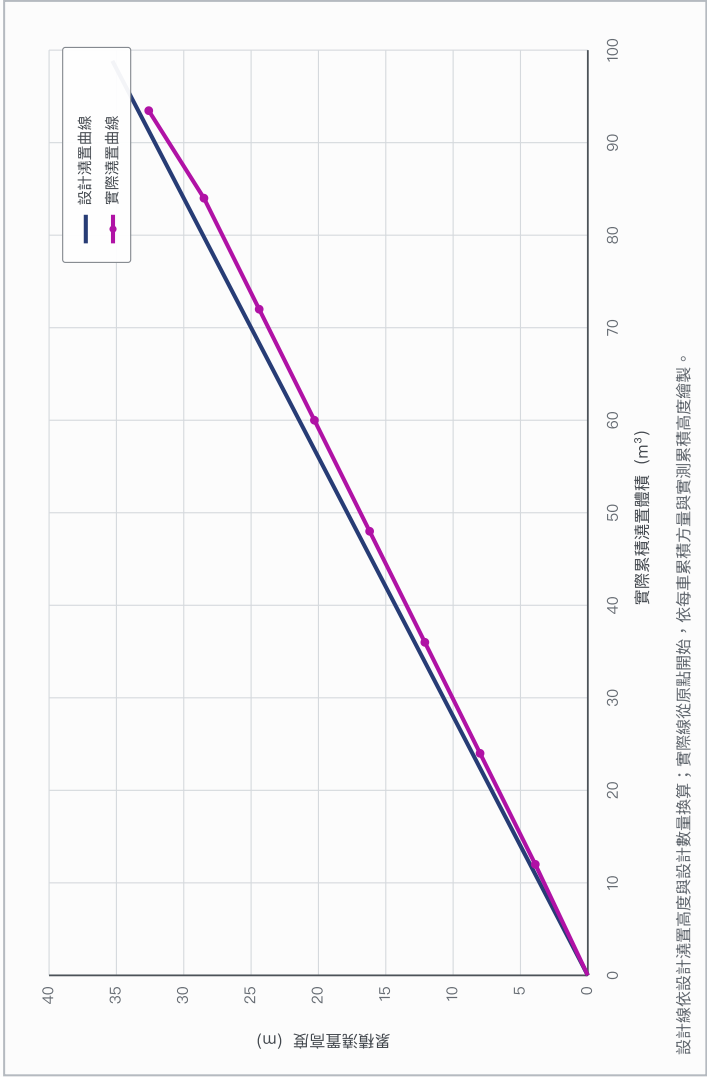

所長	副所長	擔當者

導溝施工複核表

工程名稱： Example Construction Project — North ...
施工廠商： ○○營造股份有限公司

複核日期： 2026-08-10
營造廠複核人： Site Engineer



導溝資料

複核意見
中心線偏差 1.6 cm；順序符合；導溝條件完成複核。

導溝複核項目				
項次	複核項目	確認基準	現場紀錄 / 實測	結果
1	放樣	點位、單元順序與核定圖說相符	中心線偏差 1.6 cm	符合
2	地下管線	未與既有管線衝突	已確認	符合
3	位置與淨寬	導溝內面淨寬符合設計連續壁厚+施工餘裕(5cm內)	已確認	符合
4	深度	· 深度至少 1.8 m，且回填土層以下至少 30 cm · 溝底高程符合核定施工圖	已確認	符合
5	牆厚	導溝牆厚、斷面及結構尺寸符合核定圖說	已確認	符合
6	鋼筋	鋼筋號數 / 支數 / 間距與核定配筋圖一致	已確認；號數 #5；間距 19.5 cm	符合
7	回撐木	間距 @200 cm 或依核定支撐計畫（拆模後未達指定強度時嚴禁重車行駛）	已確認	符合
8	混凝土強度	混凝土強度符合設計要求	已確認	符合
9	頂部基準高程	符合設計圖說	已確認	符合
10	壁面順直度	導溝兩側壁面垂直度 1/300，並保持順直，無明顯扭曲或局部變形	已確認	符合
11	壁面與底部完整性	無鬆動、剝落、裂縫；底部無堆積物	已確認	符合

所長	副所長	擔當者

鋼筋籠吊放前複核表

工程名稱：Example Construction Project — North ...
施工廠商：○○營造股份有限公司

複核日期：2026-08-10
營造廠複核人：Site Engineer

鋼筋籠資料

軸線 / 方向編號 公單元 21	鋼筋籠編號 C21-U / C21-L	複核意見 配筋圖逐項核對；吊放條件完成。
-----------------------	------------------------	-------------------------

配筋抽查明細

項次	部位	頂部(m)	底部(m)	支數	號數@間距(cm)	對稱	結果
1	外側 垂直 主筋	GL-0	GL-20	-	#10@60	-	符合
		GL-20	GL-35.8	-	#10@60+#10@30		
2	內側 垂直 主筋	GL-0	GL-20	-	#10@60+#10@30	-	符合
		GL-20	GL-35.8	-	#10@60+#10@15		
3	外側 水平 溫度筋	GL-0	GL-35.8	-	#10@60	✓	符合
4	內側 水平 溫度筋	-	-	-	-	✓	符合
5	水平 正交繫筋	GL-0	GL-35.8	-	#10@60	-	符合
6	垂直 小斜拉筋	GL-0	GL-35.8	-	#10@60	-	符合
7	水平 小斜拉筋	GL-0	GL-35.8	-	#10@60	-	符合
8	單元接頭垂直補強筋	-	-	3	#6	✓	符合
9	端板擋筋(母單元)	-	-	-	#5@30	-	符合
10	V型固定加強筋	-	-	-	#5@60	-	符合
11	交叉大斜拉筋	-	-	2	#10@600	✓	符合
12	垂直護耳	-	-	-	@200	-	符合
13	水平護耳	-	-	-	@240	-	符合

組裝與吊放條件

項次	複核項目	確認基準	現場紀錄 / 實測	結果
1	籠號與單元對應	籠號、單元號與核定配筋圖一致	已確認	符合
2	籠體幾何尺寸	長度、寬度、厚度與圖說相符	已確認	符合
3	接頭、搭接與焊接	位置、長度與施工規範相符	已確認	符合
4	保護層墊塊與固定	位置、數量及固定方式可確保保護層	已確認	符合
5	吊點、吊具及臨時補強	吊點、吊筋、桁架及補強可安全吊放	已確認	符合
6	接頭構件 / 預埋件	止水、接頭鋼板及預埋件位置依圖說	已確認	符合
7	外觀與吊放前狀態	無顯著變形、鬆脫、污染或妨礙吊放之雜物	已確認	符合

所長	副所長	擔當者
