

連續壁施工品質自檢總表

工程名稱： Example Construction Project ...
施工廠商： ○○營造股份有限公司

施工期間： 2026-08-10 ~ 2026-08-11
填表人： Site Engineer



壁體資訊

單元類型 公單元	單元編號 21	順序編號 03
混凝土強度(kgf/cm²) 350	設計深度(GL,m) GL -35.80 m	壁厚 / 單元長度(m) 1.00 / 2.80
澆置頂端高程(GL,m) GL -0.50	設計澆置高度(m) 35.30	設計 / 實際數量(m³) / 差異 98.84 / 102.26 / 3.46%

檢查項目

項目	判定標準	數值	單位
混凝土坍度	坍度 20 cm	20	cm
坍度允許誤差	允許誤差 2 cm	2	cm
沉泥厚度上限	沉泥厚度 ≤ 15 cm	15	cm
含砂量上限	含砂量 ≤ 1%	1	%
靜置時間下限	靜置時間 ≥ 0.5 hr	0.5	hr
垂直精度 (10 / D)	垂直壁體偏差 ≤ 1/300	300	1/n
特密管端距上限	特密管端距 ≤ 50 cm	50	cm
公單元埋入深度下限	埋入深度 ≥ 1.5 m	1.5	m
澆置中斷時間上限	澆置中斷 ≤ 30 min	30	min
澆置完成時間上限	澆置完成 ≤ 90 min	90	min
氯離子含量上限	氯離子含量 ≤ 0.15 kg/m³	0.15	kg/m³
導溝中心線偏差上限	中心線偏差 ≤ 2 cm	2	cm
壁厚偏差上限	壁厚偏差 ≤ 5 cm	5	cm
鋼筋籠雙向偏差上限	雙向（縱、橫向）偏差 ±5 cm	±5	cm
鋼筋籠頂高程偏差上限	頂高程偏差 ±5 cm	±5	cm
保護層厚度下限	保護層厚度 ≥ 10 cm	10	cm
混凝土實際與設計數量差異上限	混凝土實際與設計數量差異 ≤ 5%	5	%

品質自檢項目

項次	檢查項目	檢查標準	現場紀錄 / 實測	結果
1	連續壁單元位置、刀法順序確認	中心線偏差 ≤ 2 cm	已確認	符合
2	底部沉渣及泥屑清除確認	沉泥厚度 ≤ 15 cm	12 cm	符合
3	端板接頭清洗（公及公母單元時）	以大小鋼刷確實清洗	已確認	符合
4	穩定液新鮮液之貯存量是否充裕	依照施工計畫	已確認	符合
5	槽溝穩定液面高度控制	液面在導溝頂下 80 cm 以內；高於地下水位 1.0 m 以上（現場確認）	導溝頂下 60 cm	符合
6	廢土清運是否正常	不致影響挖掘進度	已確認	符合
7	施工動線及運土車輛之安排	不致延遲澆置時間	已確認	符合
8	壁體坍塌處是否需作補強	若需補強，說明方式	已確認	符合
9	帆布是否破損（母單元時）	單元起吊前及下放時檢查	已確認	符合
10	開挖深度與特密管長度之配合	初灌管底離槽溝底 30~50 cm	40 cm	符合
11	特密管之檢查（變形、破裂、堵塞、水密性）	下放前及過程中目視檢查	已確認	符合
12	特密管插入位置、深度、組合記錄	位置符合圖面；長度配合挖掘深度	已確認	符合
13	放置橡皮碗	澆置前放置於漏斗內	已確認	符合

連續壁施工品質自檢總表

工程名稱： Example Construction Project ...
施工廠商： ○○營造股份有限公司
施工期間： 2026-08-10 ~ 2026-08-11
填表人： Site Engineer

品質自檢項目（續）				
項次	檢查項目	檢查標準	現場紀錄 / 實測	結果
14	穩定液回收池容積是否足夠	同時間無挖掘，容積大於回收量	已確認	符合
15	混凝土坍度之確認	坍度 20 cm；允許誤差 2 cm	20 cm	符合
16	混凝土是否合乎設計強度	實測強度 ≥ 設計強度 350 kgf/cm ²	350 kgf/cm ²	符合
17	特密管埋入混凝土內之確認	公單元：埋入深度 ≥ 1.5 m	2 m	符合
18	超音波記錄結果說明	垂直壁體偏差 ≤ 1/300（填斜率分母 n，可寫 1/420）	1/420	符合

缺失及改善結果				
各項檢查完成，未發現影響施工之缺失。				

所長	副所長	擔當者

開挖與前置紀錄

工程名稱：Example Construction Project ...
開挖日期：2026-08-10 ~ 2026-08-11
施工廠商：○○營造股份有限公司
填表人：Site Engineer



壁體資訊

單元類型 公單元	單元編號 21	順序編號 03
混凝土強度(kgf/cm ²) 350	設計深度(GL,m) GL -35.80 m	壁厚 / 單元長度(m) 1.00 / 2.80
澆置頂端高程(GL,m) GL -0.50	設計澆置高度(m) 35.30	設計 / 實際數量(m ³) / 差異 98.84 / 102.26 / 3.46%

04 | 開挖紀錄開挖日期：2026-08-10 ~ 2026-08-11

出土次數 3 次	深度確認 2 次	最新深度 -35.82 m	與設計差異 -0.02 m
-------------	-------------	------------------	------------------

出土紀錄

次數	出土時間
1	07:40
2	08:20
3	09:05

深度確認

次數	確認時間	深度 (m)	與設計差異 (m)
1	12:10	-35.80	0.00
2	12:35	-35.82	-0.02

05 | 前置紀錄時間紀錄

項次	作業項目	作業日期	開始時間	完成時間
1	清沉泥	2026-08-11	08:00	08:30
2	下方鋼筋籠吊放	2026-08-11	09:00	09:30
3	上方鋼筋籠吊放	2026-08-11	10:00	
4	鋼筋籠續接	2026-08-11	11:00	11:30
5	鋼筋籠吊放完成	2026-08-11		12:30
6	特密管施工	2026-08-11	13:00	13:30

跨午夜的時間以 24 時以後接續表示（例：24:20＝翌日 00:20）。

所長	副所長	擔當者

澆置紀錄

工程名稱：Example Construction Project — North Lot

澆置日期：2026-08-11

施工廠商：○○營造股份有限公司

填表人：Site Engineer

壁體資訊

單元類型 公單元	單元編號 21	順序編號 03	混凝土強度(kgf/cm²) 350	設計深度(GL,m) GL -35.80 m	壁厚 / 單元長度(m) 1.00 / 2.80	澆置頂端高程(GL,m) GL -0.50	設計澆置高度(m) 35.30	設計 / 實際數量(m³) / 差異 98.84 / 102.26 ...
-------------	------------	------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------	--


澆置主控摘要

車次(車)	逐車累積量(m³)	設計 / 實際數量(m³) / 差異	預估 / 實測 / 差異(m)
8	102.26	98.84 / 102.26 / 3.46%	36.52 / 36.30 / -0.22

逐車混凝土澆置紀錄

車次	車號	出廠	卸料	結束	坍度(cm)	方量(m³)	累積(m³)	預估高(m)	實際高(m)	澆置時間(分)
1	C01	12:28	13:20	13:33	(試1) 18	13.00	13.00	4.64	4.62	65
2	C02	12:50	13:42	13:55		13.00	26.00	9.29	9.26	65
3	C03	13:28	14:20	14:33		13.00	39.00	13.93	13.90	65
4	C04	13:50	14:42	14:55		13.00	52.00	18.57	18.54	65
5	C05	14:28	15:20	15:33		13.00	65.00	23.21	23.18	65
6	C06	14:50	15:42	15:55		13.00	78.00	27.86	27.82	65
7	C07	15:28	16:20	16:33		13.00	91.00	32.50	32.46	65
8	C08	15:50	16:42	16:55		11.26	102.26	36.52	36.30	65

跨午夜的時間以 24 時以後接續表示 (例：25:30＝翌日 01:30)；澆置時間＝結束 - 出廠。

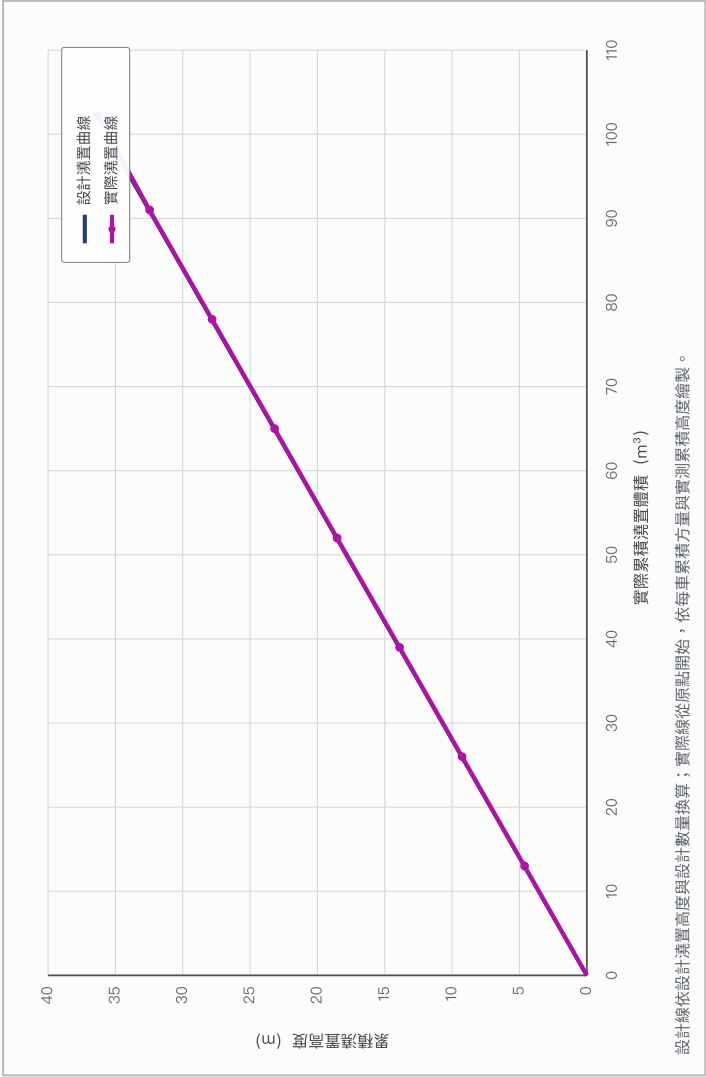

所長	副所長	擔當者

導溝施工複核表

工程名稱：Example Construction Project — North ...
施工廠商：○○營造股份有限公司

複核日期：2026-08-10
營造廠複核人：Site Engineer



導溝資料

軸線 / 方向編號 X3~X7 南側	複核意見 中心線偏差 1.6 cm；順序符合；導溝條件完成複核。
-----------------------	-------------------------------------

導溝複核項目

項次	複核項目	確認基準	現場紀錄 / 實測	結果
1	放樣	點位、單元順序與核定圖說相符	中心線偏差 1.6 cm	符合
2	地下管線	未與既有管線衝突	已確認	符合
3	位置與淨寬	導溝內面淨寬在設計值 ±5 cm 以內	設計 100 cm；實測 103 cm (許可值 95~105 cm)	符合
4	深度	· 深度依結構設計圖且至少 1.8 m，實測不小於設計深度 · 回填土層以下至少 30 cm (現場確認) · 溝底高程符合核定施工圖	設計 2.0 m；實測 2.05 m	符合
5	牆厚	導溝牆厚不小於設計值；斷面及結構尺寸符合核定圖說	設計 20 cm；實測 20.5 cm	符合
6	鋼筋	號數與設計相同、間距不大於設計間距；支數與核定配筋圖一致	設計 #5@20 cm；實測 #5@20 cm	符合
7	回撐木	間距 @200 cm 或依核定支撐計畫 (拆模後未達指定強度時嚴禁重車行駛)	已確認	符合
8	混凝土強度	實測強度不小於設計強度	設計 210 kgf/cm²；實測 245 kgf/cm²	符合
9	頂部基準高程	符合設計圖說	GL-0.30 m	符合
10	壁面順直度	導溝兩側壁面垂直度 1/300，並保持順直，無明顯扭曲或局部變形	已確認	符合
11	壁面與底部完整性	無鬆動、剝落、裂縫；底部無堆積物	已確認	符合

所長	副所長	擔當者

鋼筋籠吊放前複核表

工程名稱： Example Construction Project — North ...
施工廠商： ○○營造股份有限公司

複核日期： 2026-08-10
營造廠複核人： Site Engineer



鋼筋籠資料

單元編號 公單元 21	順序編號 03
鋼筋籠編號 C21-U / C21-L	複核意見 配筋圖逐項核對；吊放條件完成。

配筋抽查明細

項次	部位	頂部(m)	底部(m)	支數	號數@間距(cm)	對稱	結果
1	外側 垂直 主筋	GL-0	GL-20	-	#10@60	-	符合
		GL-20	GL-35.8	-	#10@60+#10@30		
2	內側 垂直 主筋	GL-0	GL-20	-	#10@60+#10@30	-	符合
		GL-20	GL-35.8	-	#10@60+#10@15		
3	外側 水平 溫度筋	GL-0	GL-35.8	-	#10@60	✓	符合
4	內側 水平 溫度筋	-	-	-	-	✓	符合
5	水平 正交繫筋	GL-0	GL-35.8	-	#10@60	-	符合
6	垂直 小斜拉筋	GL-0	GL-35.8	-	#10@60	-	符合
7	水平 小斜拉筋	GL-0	GL-35.8	-	#10@60	-	符合
8	單元接頭垂直補強筋	-	-	3	#6	✓	符合
9	端板擋筋(母單元)	-	-	-	#5@30	-	符合
10	V型固定加強筋	-	-	-	#5@60	-	符合
11	交叉大斜拉筋	-	-	2	#10@600	✓	符合
12	垂直護耳	-	-	-	@200	-	符合
13	水平護耳	-	-	-	@240	-	符合

組裝與吊放條件

項次	複核項目	確認基準	現場紀錄 / 實測	結果
1	籠號與單元對應	籠號、單元號與核定配筋圖一致	已確認	符合
2	籠體幾何尺寸	長度、寬度、厚度與圖說相符	已確認	符合
3	接頭、搭接與焊接	位置、長度與施工規範相符	已確認	符合
4	保護層墊塊與固定	位置、數量及固定方式可確保保護層	已確認	符合
5	吊點、吊具及臨時補強	吊點、吊筋、桁架及補強可安全吊放	已確認	符合
6	接頭構件 / 預埋件	止水、接頭鋼板及預埋件位置依圖說	已確認	符合
7	外觀與吊放前狀態	無顯著變形、鬆脫、污染或妨礙吊放之雜物	已確認	符合

所長	副所長	擔當者

鋼筋籠複核照片

工程名稱： Example Construction Project — North ...
施工廠商： ○○營造股份有限公司

複核日期： 2026-08-10
營造廠複核人： Site Engineer

鋼筋籠照片	
1	
鋼筋籠檢查	
2	
3	

所長	副所長	擔當者
