

連續壁施工品質自檢總表

工程名稱： Example Construction Project — North Lot
施工廠商： ○○營造股份有限公司

施工日期： 2026-08-11
填表人： Site Engineer



壁體資訊

單元類型 公單元	樁 / 壁編號 21	順序編號 03
混凝土強度(kgf/cm²) 350	設計深度(GL,m) GL -35.80 m	壁厚 / 單元長度(m) 1.00 / 2.80
澆置頂端高程(GL,m) GL -0.50	設計澆置高度(m) 35.30	設計 / 實際數量(m³) 98.84 / 107.46

檢查項目

項目	判定標準	數值	單位
混凝土坍度	坍度 18 cm	18	cm
坍度允許誤差	允許誤差 2 cm	2	cm
沉泥厚度上限	沉泥厚度 ≤ 10 cm	10	cm
含砂量上限	含砂量 ≤ 1%	1	%
靜置時間下限	靜置時間 ≥ 0.5 hr	0.5	hr
垂直精度 (10 / D)	垂直壁體偏差 ≤ 1/300	300	1/n
特密管端距上限	特密管端距 ≤ 20 cm	20	cm
公單元埋入深度下限	1.5	1.5	m
澆置中斷時間上限	澆置中斷 ≤ 30 min	30	min
澆置完成時間上限	澆置完成 ≤ 90 min	90	min
氯離子含量上限	氯離子含量 ≤ 0.15 kg/m³	0.15	kg/m³
導溝中心線偏差上限	中心線偏差 ≤ 2 cm	2	cm
壁厚偏差上限	壁厚偏差 ≤ 5 cm	5	cm
鋼筋籠縱向偏差上限	縱向偏差 ±7.5 cm	±7.5	cm
鋼筋籠頂高程偏差上限	頂高程偏差 ±5 cm	±5	cm
保護層厚度下限	保護層厚度 ≥ 7.5 cm	7.5	cm
實際 / 設計數量差異上限	實際 / 設計數量差異 ≤ 10%	10	%

品質自檢項目

項次	檢查項目	檢查標準	現場紀錄 / 實測	結果
1	連續壁單元位置、刀法順序確認	中心線偏差 ≤ 2 cm	已確認	符合
2	底部沉渣及泥屑清除確認	沉泥厚度 ≤ 10 cm	已確認	符合
3	端板接頭清洗 (公及公母單元時)	以大小鋼刷確實清洗	已確認	符合
4	穩定液新鮮液之貯存量是否充裕	依照施工計畫	已確認	符合
5	槽溝穩定液面高度控制	鋪面下 50 cm~100 cm 以內	已確認	符合
6	廢土清運是否正常	不致影響挖掘進度	已確認	符合
7	施工動線及運土車輛之安排	不致延遲澆置時間	已確認	符合
8	壁體坍塌處是否需作補強	若需補強，說明方式	已確認	符合
9	帆布是否破損 (母單元時)	單元起吊前及下放時檢查	已確認	符合
10	開挖深度與特密管長度之配合	特密管端距 ≤ 20 cm	已確認	符合
11	特密管之檢查 (變形、破裂、堵塞、水密性)	下放前及過程中目視檢查	已確認	符合
12	特密管插入位置、深度、組合記錄	位置符合圖面；長度配合挖掘深度	已確認	符合
13	放置橡皮碗	澆置前放置於漏斗內	已確認	符合
14	穩定液回收池容積是否足夠	同時間無挖掘，容積大於回收量	已確認	符合

連續壁施工品質自檢總表

工程名稱： Example Construction Project — North Lot
施工廠商： ○○營造股份有限公司

施工日期： 2026-08-11
填表人： Site Engineer

品質自檢項目（續）				
項次	檢查項目	檢查標準	現場紀錄 / 實測	結果
15	混凝土坍度之確認	坍度 18 cm；允許誤差 2 cm	已確認	符合
16	混凝土是否合乎設計強度	記錄空打段、實打段 GL 與強度	已確認	符合
17	特密管埋入混凝土內之確認	公單元：1.5	已確認	符合
18	超音波記錄結果說明	依單元型式及圖說完成檢測記錄	已確認	符合

缺失及改善結果				
各項檢查完成，未發現影響施工之缺失。				

所長	副所長	擔當者

開挖與前置紀錄

工程名稱：Example Construction Project — North Lot
施工廠商：○○營造股份有限公司

施工日期：2026-08-11
填表人：Site Engineer



壁體資訊

單元類型 公單元	樁 / 壁編號 21	順序編號 03
混凝土強度(kgf/cm ²) 350	設計深度(GL,m) GL -35.80 m	壁厚 / 單元長度(m) 1.00 / 2.80
溝置頂端高程(GL,m) GL -0.50	設計溝置高度(m) 35.30	設計 / 實際數量(m ³) 98.84 / 107.46

04 | 開挖紀錄

出土次數 3 次	深度確認 2 次	最新深度 -35.82 m	與設計差異 -0.02 m
-------------	-------------	------------------	------------------

出土紀錄

次數	出土時間
1	07:40
2	08:20
3	09:05

深度確認

次數	確認時間	深度 (m)	與設計差異 (m)
1	12:10	-35.80	0.00
2	12:35	-35.82	-0.02

05 | 前置紀錄時間紀錄

項次	作業項目	開始時間	完成時間
1	清沉泥	08:00	08:30
2	下方鋼筋籠吊放	09:00	09:30
3	上方鋼筋籠吊放	010:00	
4	鋼筋籠續接	011:00	011:30
5	鋼筋籠吊放完成		012:30
6	特密管施工	013:00	013:30

所長	副所長	擔當者

澆置紀錄

工程名稱：Example Construction Project — North Lot

施工日期：2026-08-11

施工廠商：○○營造股份有限公司

填表人：Site Engineer

壁體資訊


單元類型	樁 / 壁編號	21	順序編號	03	混凝土強度(kgf/cm ²)	設計深度(GL,m)	壁厚 / 單元長度(m)	澆置頂端高程(GL,m)	設計澆置高度(m)	設計 / 實際數量(m ³)
公單元					350	GL -35.80 m	1.00 / 2.80	GL -0.50	35.30	98.84 / 107.46

澆置主控摘要

車次(車)	逐車累積量(m ³)	設計 / 實際數量(m ³)	預估 / 實測 / 差異(m)
8	93.46	98.84 / 107.46	33.38 / 32.60 / -0.78

逐車混凝土澆置紀錄

車次	車號	出廠	卸料	結束	坍度(cm)	方量(m ³)	累積(m ³)	預估高(m)	實際高(m)	澆置時間(分)
1	C01	12:28	13:20	13:33	(試) 18	12.00	12.00	4.29	3.90	65
2	C02	12:50	13:42	13:55		12.00	24.00	8.57	8.00	65
3	C03	13:28	14:20	14:33		12.00	36.00	12.86	12.10	65
4	C04	13:50	14:42	14:55		12.00	48.00	17.14	16.20	65
5	C05	14:28	15:20	15:33		12.00	60.00	21.43	20.30	65
6	C06	14:50	15:42	15:55		12.00	72.00	25.71	24.40	65
7	C07	15:28	16:20	16:33		12.00	84.00	30.00	28.50	65
8	C08	15:50	16:42	16:55		9.46	93.46	33.38	32.60	65

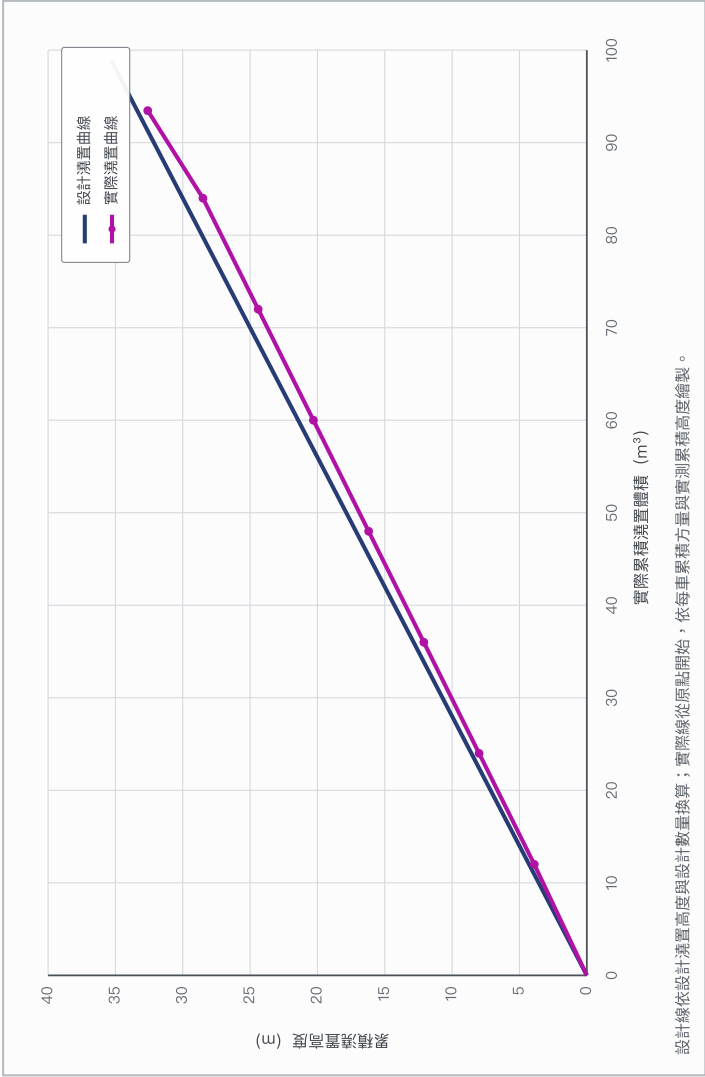

所長	副所長	擔當者

導溝施工複核表

工程名稱： Example Construction Project — North Lot
施工廠商： ○○營造股份有限公司

施工日期： 2026-08-10
填表人： Site Engineer



導溝資料

單元編號 21	複核意見 中心線偏差 1.6 cm；順序符合；導溝條件完成複核。	
------------	-------------------------------------	--

導溝複核項目

項次	複核項目	確認基準	現場紀錄 / 實測	結果
1	放樣與單元中心線	放樣點位、單元順序與核定圖說相符；應留存測量實測值	中心線偏差 1.6 cm	符合
2	地下管線位置確認	依竣工圖、探測或試掘結果確認，導溝位置不得與既有管線衝突	已確認	符合
3	導溝寬度 / 淨寬	實測導溝內面淨寬符合設計壁厚及核定加寬值	已確認	符合
4	導溝深度與底高程	導溝深度至少 1.8 m，且深入原土層 30 cm 以上；底高程及測量基準符合核定施工圖	已確認	符合
5	導溝牆壁厚度	導溝牆厚、斷面及結構尺寸符合核定圖說	已確認	符合
6	導溝鋼筋號數與間距	鋼筋號數、支數 / 間距與核定配筋圖一致；於下方欄位填寫實測或圖說值	已確認；號數 D16；間距 19.5 cm	符合
7	回撐木配置與間距	回撐木間距 @200 cm（如核定支撐計畫另有規定，依核定計畫），固定牢靠且可防止導溝變形	已確認	符合
8	導溝混凝土強度	混凝土強度符合設計要求，並可追溯出廠或試驗紀錄	已確認	符合
9	導溝垂直與壁面完整性	導溝壁面垂直度 1/300，且無鬆動、剝落、裂縫；底部無堆積物	已確認	符合
10	單元界面與接頭區	界面位置、接頭區淨空可供後續施工	已確認	符合
11	開挖坡面與鄰產保護	開挖坡面應維持臨時穩定；鄰產及地下管線位置已確認，並採必要保護措施	已確認	符合
12	成槽前放行條件	測量複核、現場條件及廠商自檢紀錄齊備	已確認	符合

所長	副所長	擔當者

鋼筋籠吊放前複核表

工程名稱： Example Construction Project — North Lot
施工廠商： ○○營造股份有限公司

施工日期： 2026-08-10
填表人： Site Engineer

鋼筋籠資料

單元編號 21	鋼筋籠編號 C21-U / C21-L	複核意見 配筋圖逐項核對；吊放條件完成。
------------	------------------------	-------------------------

配筋複核明細

項次	位置 / 用途	設計號數	設計數量 / 間距	實際號數	實際數量 / 間距	結果
1	A 面縱向主筋	D32	32支	D32	32支	符合
2	B 面縱向主筋	D32	32支	D32	32支	符合
3	A 面水平分布筋	D16	@20 cm	D16	@20 cm	符合
4	B 面水平分布筋	D16	@20 cm	D16	@20 cm	符合
5	垂直補強筋	D16	@20 cm	D16	@20 cm	符合
6	桁架筋 / 剛性補強	D16	@20 cm	D16	@20 cm	符合
7	吊筋 / 吊環	D16	@20 cm	D16	@20 cm	符合
8	接頭區補強筋	D16	@20 cm	D16	@20 cm	符合
9	保護層定位筋 / 墊塊	D16	@20 cm	D16	@20 cm	符合

組裝與吊放條件

項次	複核項目	確認基準	現場紀錄 / 實測	結果
1	籠號與單元對應	籠號、單元號與核定配筋圖一致	已確認	符合
2	籠體幾何尺寸	長度、寬度、厚度與圖說相符	已確認	符合
3	接頭、搭接與焊接	位置、長度與施工規範相符	已確認	符合
4	保護層墊塊與固定	位置、數量及固定方式可確保保護層	已確認	符合
5	吊點、吊具及臨時補強	吊點、吊筋、桁架及補強可安全吊放	已確認	符合
6	接頭構件 / 預埋件	止水、接頭鋼板及預埋件位置依圖說	已確認	符合
7	外觀與吊放前狀態	無顯著變形、鬆脫、污染或妨礙吊放之雜物	已確認	符合

所長	副所長	擔當者
