

連續壁施工品質自檢總表

工程名稱： Example Construction Project ...  
施工廠商： ○○營造股份有限公司

施工期間： 2026-08-10 ~ 2026-08-11  
填表人： Site Engineer



壁體資訊

|                          |                           |                                 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 單元類型<br>公單元              | 樁 / 壁編號<br>21             | 順序編號<br>03                      |
| 混凝土強度(kgf/cm²)<br>350    | 設計深度(GL,m)<br>GL -35.80 m | 壁厚 / 單元長度(m)<br>1.00 / 2.80     |
| 澆置頂端高程(GL,m)<br>GL -0.50 | 設計澆置高度(m)<br>35.30        | 設計 / 實際數量(m³)<br>98.84 / 107.46 |

檢查項目

| 項目            | 判定標準               | 數值   | 單位    |
|---------------|--------------------|------|-------|
| 混凝土坍度         | 坍度 18 cm           | 18   | cm    |
| 坍度允許誤差        | 允許誤差 2 cm          | 2    | cm    |
| 沉泥厚度上限        | 沉泥厚度 ≤ 10 cm       | 10   | cm    |
| 含砂量上限         | 含砂量 ≤ 1%           | 1    | %     |
| 靜置時間下限        | 靜置時間 ≥ 0.5 hr      | 0.5  | hr    |
| 垂直精度 (10 / D) | 垂直壁體偏差 ≤ 1/300     | 300  | 1/n   |
| 特密管端距上限       | 特密管端距 ≤ 20 cm      | 20   | cm    |
| 公單元埋入深度下限     | 1.5                | 1.5  | m     |
| 澆置中斷時間上限      | 澆置中斷 ≤ 30 min      | 30   | min   |
| 澆置完成時間上限      | 澆置完成 ≤ 90 min      | 90   | min   |
| 氯離子含量上限       | 氯離子含量 ≤ 0.15 kg/m³ | 0.15 | kg/m³ |
| 導溝中心線偏差上限     | 中心線偏差 ≤ 2 cm       | 2    | cm    |
| 壁厚偏差上限        | 壁厚偏差 ≤ 5 cm        | 5    | cm    |
| 鋼筋籠縱向偏差上限     | 縱向偏差 ±7.5 cm       | ±7.5 | cm    |
| 鋼筋籠頂高程偏差上限    | 頂高程偏差 ±5 cm        | ±5   | cm    |
| 保護層厚度下限       | 保護層厚度 ≥ 7.5 cm     | 7.5  | cm    |
| 實際 / 設計數量差異上限 | 實際 / 設計數量差異 ≤ 10%  | 10   | %     |

品質自檢項目

| 項次 | 檢查項目                  | 檢查標準                | 現場紀錄 / 實測 | 結果 |
|----|-----------------------|---------------------|-----------|----|
| 1  | 連續壁單元位置、刀法順序確認        | 中心線偏差 ≤ 2 cm        | 已確認       | 符合 |
| 2  | 底部沉渣及泥屑清除確認           | 沉泥厚度 ≤ 10 cm        | 已確認       | 符合 |
| 3  | 端板接頭清洗 (公及公母單元時)      | 以大小鋼刷確實清洗           | 已確認       | 符合 |
| 4  | 穩定液新鮮液之貯存量是否充裕        | 依照施工計畫              | 已確認       | 符合 |
| 5  | 槽溝穩定液面高度控制            | 鋪面下 50 cm~100 cm 以內 | 已確認       | 符合 |
| 6  | 廢土清運是否正常              | 不致影響挖掘進度            | 已確認       | 符合 |
| 7  | 施工動線及運土車輛之安排          | 不致延遲澆置時間            | 已確認       | 符合 |
| 8  | 壁體坍塌處是否需作補強           | 若需補強，說明方式           | 已確認       | 符合 |
| 9  | 帆布是否破損 (母單元時)         | 單元起吊前及下放時檢查         | 已確認       | 符合 |
| 10 | 開挖深度與特密管長度之配合         | 特密管端距 ≤ 20 cm       | 已確認       | 符合 |
| 11 | 特密管之檢查 (變形、破裂、堵塞、水密性) | 下放前及過程中目視檢查         | 已確認       | 符合 |
| 12 | 特密管插入位置、深度、組合記錄       | 位置符合圖面；長度配合挖掘深度     | 已確認       | 符合 |
| 13 | 放置橡皮碗                 | 澆置前放置於漏斗內           | 已確認       | 符合 |
| 14 | 穩定液回收池容積是否足夠          | 同時間無挖掘，容積大於回收量      | 已確認       | 符合 |

連續壁施工品質自檢總表

工程名稱： Example Construction Project ...  
施工廠商： ○○營造股份有限公司

施工期間： 2026-08-10 ~ 2026-08-11  
填表人： Site Engineer

| 品質自檢項目（續） |              |                    |           |    |
|-----------|--------------|--------------------|-----------|----|
| 項次        | 檢查項目         | 檢查標準               | 現場紀錄 / 實測 | 結果 |
| 15        | 混凝土坍度之確認     | 坍度 18 cm；允許誤差 2 cm | 已確認       | 符合 |
| 16        | 混凝土是否合乎設計強度  | 記錄空打段、實打段 GL 與強度   | 已確認       | 符合 |
| 17        | 特密管埋入混凝土內之確認 | 公單元：1.5            | 已確認       | 符合 |
| 18        | 超音波記錄結果說明    | 依單元型式及圖說完成檢測記錄     | 已確認       | 符合 |

| 缺失及改善結果            |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|
| 各項檢查完成，未發現影響施工之缺失。 |  |  |  |  |

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 所長 | 副所長 | 擔當者 |
|    |     |     |

開挖與前置紀錄

工程名稱：Example Construction Project ...  
施工廠商：○○營造股份有限公司

開挖日期：2026-08-10 ~ 2026-08-11  
填表人：Site Engineer



壁體資訊

|                                    |                           |                                              |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| 單元類型<br>公單元                        | 樁 / 壁編號<br>21             | 順序編號<br>03                                   |
| 混凝土強度(kgf/cm <sup>2</sup> )<br>350 | 設計深度(GL,m)<br>GL -35.80 m | 壁厚 / 單元長度(m)<br>1.00 / 2.80                  |
| 澆置頂端高程(GL,m)<br>GL -0.50           | 設計澆置高度(m)<br>35.30        | 設計 / 實際數量(m <sup>3</sup> )<br>98.84 / 107.46 |

04 | 開挖紀錄開挖日期：2026-08-10 ~ 2026-08-11

|             |             |                  |                  |
|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 出土次數<br>3 次 | 深度確認<br>2 次 | 最新深度<br>-35.82 m | 與設計差異<br>-0.02 m |
|-------------|-------------|------------------|------------------|

| 出土紀錄 |       |
|------|-------|
| 次數   | 出土時間  |
| 1    | 07:40 |
| 2    | 08:20 |
| 3    | 09:05 |

| 深度確認 |       |        |           |
|------|-------|--------|-----------|
| 次數   | 確認時間  | 深度 (m) | 與設計差異 (m) |
| 1    | 12:10 | -35.80 | 0.00      |
| 2    | 12:35 | -35.82 | -0.02     |

| 05   前置紀錄時間紀錄 |         |            |       |       |
|---------------|---------|------------|-------|-------|
| 項次            | 作業項目    | 作業日期       | 開始時間  | 完成時間  |
| 1             | 清沉泥     | 2026-08-11 | 08:00 | 08:30 |
| 2             | 下方鋼筋籠吊放 | 2026-08-11 | 09:00 | 09:30 |
| 3             | 上方鋼筋籠吊放 | 2026-08-11 | 10:00 |       |
| 4             | 鋼筋籠續接   | 2026-08-11 | 11:00 | 11:30 |
| 5             | 鋼筋籠吊放完成 | 2026-08-11 |       | 12:30 |
| 6             | 特密管施工   | 2026-08-11 | 13:00 | 13:30 |

跨午夜的時間以 24 時以後接續表示（例：24:20＝翌日 00:20）。

| 所長 | 副所長 | 擔當者 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

澆置紀錄

工程名稱：Example Construction Project — North Lot

澆置日期：2026-08-11

施工廠商：○○營造股份有限公司

填表人：Site Engineer

壁體資訊

|      |         |    |      |    |                |     |            |             |              |             |              |          |           |       |               |                |
|------|---------|----|------|----|----------------|-----|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|-------|---------------|----------------|
| 單元類型 | 牆 / 壁編號 | 21 | 順序編號 | 03 | 混凝土強度(kgf/cm²) | 350 | 設計深度(GL,m) | GL -35.80 m | 壁厚 / 單元長度(m) | 1.00 / 2.80 | 澆置頂端高程(GL,m) | GL -0.50 | 設計澆置高度(m) | 35.30 | 設計 / 實際數量(m³) | 98.84 / 107.46 |
| 公單元  |         |    |      |    |                |     |            |             |              |             |              |          |           |       |               |                |


澆置主控摘要

|       |           |                |                       |
|-------|-----------|----------------|-----------------------|
| 車次(車) | 逐車累積量(m³) | 設計 / 實際數量(m³)  | 預估 / 實測 / 差異(m)       |
| 8     | 93.46     | 98.84 / 107.46 | 33.38 / 32.60 / -0.78 |

逐車混凝土澆置紀錄

| 車次 | 車號  | 出廠    | 卸料    | 結束    | 坍度(cm)  | 方量(m³) | 累積(m³) | 預估高(m) | 實際高(m) | 澆置時間(分) |
|----|-----|-------|-------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1  | C01 | 12:28 | 13:20 | 13:33 | (試1) 18 | 12.00  | 12.00  | 4.29   | 3.90   | 65      |
| 2  | C02 | 12:50 | 13:42 | 13:55 |         | 12.00  | 24.00  | 8.57   | 8.00   | 65      |
| 3  | C03 | 13:28 | 14:20 | 14:33 |         | 12.00  | 36.00  | 12.86  | 12.10  | 65      |
| 4  | C04 | 13:50 | 14:42 | 14:55 |         | 12.00  | 48.00  | 17.14  | 16.20  | 65      |
| 5  | C05 | 14:28 | 15:20 | 15:33 |         | 12.00  | 60.00  | 21.43  | 20.30  | 65      |
| 6  | C06 | 14:50 | 15:42 | 15:55 |         | 12.00  | 72.00  | 25.71  | 24.40  | 65      |
| 7  | C07 | 15:28 | 16:20 | 16:33 |         | 12.00  | 84.00  | 30.00  | 28.50  | 65      |
| 8  | C08 | 15:50 | 16:42 | 16:55 |         | 9.46   | 93.46  | 33.38  | 32.60  | 65      |

跨午夜的時間以 24 時以後接續表示 (例：25:30＝翌日 01:30)；澆置時間＝結束 - 出廠。

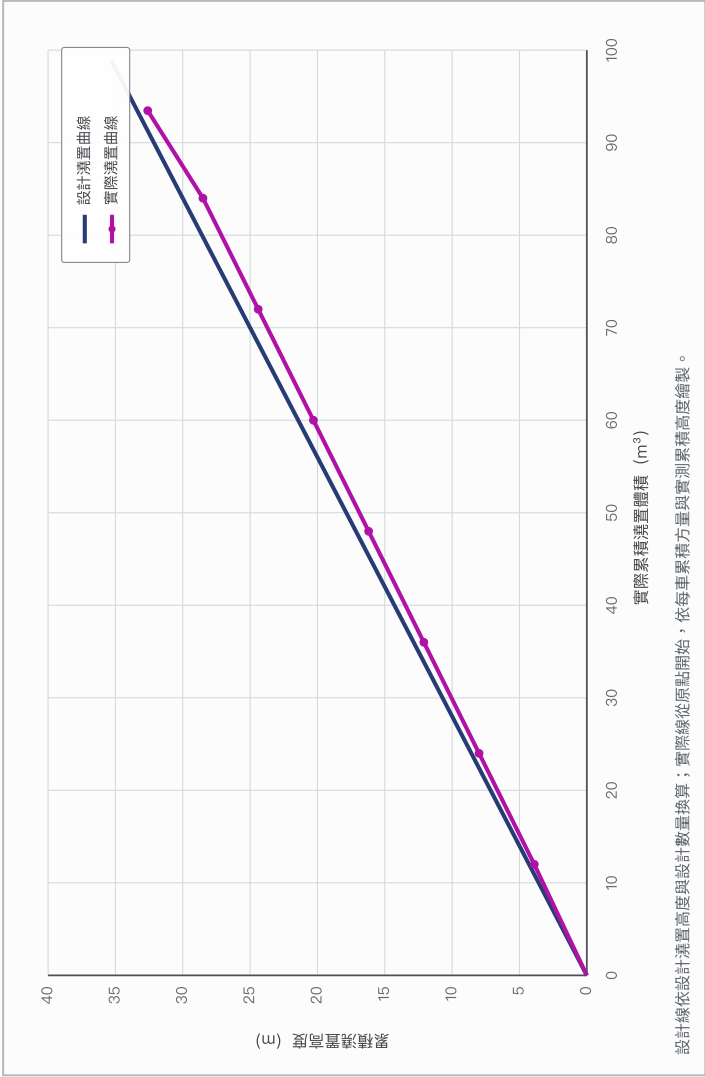

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 所長 | 副所長 | 擔當者 |
|    |     |     |

導溝施工複核表

工程名稱： Example Construction Project — North ...  
施工廠商： ○○營造股份有限公司

複核日期： 2026-08-10  
營造廠複核人： Site Engineer



導溝資料

複核意見  
中心線偏差 1.6 cm；順序符合；導溝條件完成複核。

導溝複核項目

| 項次 | 複核項目       | 確認基準                                          | 現場紀錄 / 實測             | 結果 |
|----|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----|
| 1  | 放樣與單元中心線   | 放樣點位、單元順序與核定圖說相符；應留存測量實測值                     | 中心線偏差 1.6 cm          | 符合 |
| 2  | 地下管線位置確認   | 依竣工圖、探測或試掘結果確認，導溝位置不得與既有管線衝突                  | 已確認                   | 符合 |
| 3  | 導溝寬度 / 淨寬  | 實測導溝內面淨寬符合設計壁厚及核定加寬值                          | 已確認                   | 符合 |
| 4  | 導溝深度與底高程   | 導溝深度至少 1.8 m，且深入原土層 30 cm 以上；底高程及測量基準符合核定施工圖  | 已確認                   | 符合 |
| 5  | 導溝牆壁厚度     | 導溝牆厚、斷面及結構尺寸符合核定圖說                            | 已確認                   | 符合 |
| 6  | 導溝鋼筋號數與間距  | 鋼筋號數、支數 / 間距與核定配筋圖一致；於下方欄位填寫實測或圖說值            | 已確認；號數 D16；間距 19.5 cm | 符合 |
| 7  | 回撐木配置與間距   | 回撐木間距 @200 cm（如核定支撐計畫另有規定，依核定計畫），固定牢靠且可防止導溝變形 | 已確認                   | 符合 |
| 8  | 導溝混凝土強度    | 混凝土強度符合設計要求，並可追溯出廠或試驗紀錄                       | 已確認                   | 符合 |
| 9  | 導溝垂直與壁面完整性 | 導溝壁面垂直度 1/300，且無鬆動、剝落、裂縫；底部無堆積物               | 已確認                   | 符合 |
| 10 | 單元界面與接頭區   | 界面位置、接頭區淨空可供後續施工                              | 已確認                   | 符合 |
| 11 | 開挖坡面與鄰產保護  | 開挖坡面應維持臨時穩定；鄰產及地下管線位置已確認，並採必要保護措施             | 已確認                   | 符合 |
| 12 | 成槽前放行條件    | 測量複核、現場條件及廠商自檢紀錄齊備                            | 已確認                   | 符合 |

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 所長 | 副所長 | 擔當者 |
|    |     |     |

鋼筋籠吊放前複核表

工程名稱：Example Construction Project — North ...  
施工廠商：○○營造股份有限公司

複核日期：2026-08-10  
營造廠複核人：Site Engineer

鋼筋籠資料

|                  |                        |                         |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| 單元編號<br>公單元   21 | 鋼筋籠編號<br>C21-U / C21-L | 複核意見<br>配筋圖逐項核對；吊放條件完成。 |
|------------------|------------------------|-------------------------|

配筋複核明細

| 項次 | 位置 / 用途     | 設計號數 | 設計數量 / 間距 | 實際號數 | 實際數量 / 間距 | 結果 |
|----|-------------|------|-----------|------|-----------|----|
| 1  | A 面縱向主筋     | D32  | 32支       | D32  | 32支       | 符合 |
| 2  | B 面縱向主筋     | D32  | 32支       | D32  | 32支       | 符合 |
| 3  | A 面水平分布筋    | D16  | @20 cm    | D16  | @20 cm    | 符合 |
| 4  | B 面水平分布筋    | D16  | @20 cm    | D16  | @20 cm    | 符合 |
| 5  | 垂直補強筋       | D16  | @20 cm    | D16  | @20 cm    | 符合 |
| 6  | 桁架筋 / 剛性補強  | D16  | @20 cm    | D16  | @20 cm    | 符合 |
| 7  | 吊筋 / 吊環     | D16  | @20 cm    | D16  | @20 cm    | 符合 |
| 8  | 接頭區補強筋      | D16  | @20 cm    | D16  | @20 cm    | 符合 |
| 9  | 保護層定位筋 / 墊塊 | D16  | @20 cm    | D16  | @20 cm    | 符合 |

組裝與吊放條件

| 項次 | 複核項目       | 確認基準                | 現場紀錄 / 實測 | 結果 |
|----|------------|---------------------|-----------|----|
| 1  | 籠號與單元對應    | 籠號、單元號與核定配筋圖一致      | 已確認       | 符合 |
| 2  | 籠體幾何尺寸     | 長度、寬度、厚度與圖說相符       | 已確認       | 符合 |
| 3  | 接頭、搭接與焊接   | 位置、長度與施工規範相符        | 已確認       | 符合 |
| 4  | 保護層墊塊與固定   | 位置、數量及固定方式可確保保護層    | 已確認       | 符合 |
| 5  | 吊點、吊具及臨時補強 | 吊點、吊筋、桁架及補強可安全吊放    | 已確認       | 符合 |
| 6  | 接頭構件 / 預埋件 | 止水、接頭鋼板及預埋件位置依圖說    | 已確認       | 符合 |
| 7  | 外觀與吊放前狀態   | 無顯著變形、鬆脫、污染或妨礙吊放之雜物 | 已確認       | 符合 |

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 所長 | 副所長 | 擔當者 |
|    |     |     |
