連續壁施工品質自檢總表

工程名稱： Example Construction Project …
施工廠商： ○○營造股份有限公司
施工期間： 2026-08-10 ～ 2026-08-11
填表人： Site Engineer

壁體資訊

單元類型	單元編號	順序編號
公單元	21	03
混凝土強度(kgf/cm²)	設計深度(GL,m)	壁厚 / 單元長度(m)
350	GL −35.80 m	1.00 / 2.80
澆置頂端高程(GL,m)	設計澆置高度(m)	設計 / 實際數量(m³) / 差異
GL −0.50	35.30	98.84 / 102.26 / 3.46%

檢查項目

項目	判定標準	數值	單位	結果
混凝土坍度	坍度 20 cm	20	cm	合格
坍度允許誤差	允許誤差 2 cm		cm	
沉泥厚度上限	沉泥厚度 ≤ 15 cm	12	cm	合格
含砂量上限	含砂量 ≤ 1%		%	
靜置時間下限	靜置時間 ≥ 0.5 hr		hr	
垂直精度（10 / D）	垂直壁體偏差 ≤ 1/300	420	1/n	合格
特密管端距上限	特密管端距 ≤ 50 cm	40	cm	合格
公單元埋入深度下限	埋入深度 ≥ 1.5 m	2.0	m	合格
澆置中斷時間上限	澆置中斷 ≤ 30 min		min	
澆置完成時間上限	澆置完成 ≤ 90 min		min	
氯離子含量上限	氯離子含量 ≤ 0.15 kg/m³		kg/m³	
導溝中心線偏差上限	中心線偏差 ≤ 2 cm		cm	
壁厚偏差上限	壁厚偏差 ≤ 5 cm		cm	
鋼筋籠雙向偏差上限	雙向（縱、橫向）偏差 ±5 cm		cm	
鋼筋籠頂高程偏差上限	頂高程偏差 ±5 cm		cm	
保護層厚度下限	保護層厚度 ≥ 10 cm		cm	
混凝土實際與設計數量差異上限	混凝土實際與設計數量差異 ≤ 5%	3.46	%	合格

品質自檢項目

項次	檢查項目	檢查標準	現場紀錄 / 實測	結果
1	連續壁單元位置、刀法順序確認	中心線偏差 ≤ 2 cm	已確認	合格
2	底部沉渣及泥屑清除確認	沉泥厚度 ≤ 15 cm	12 cm	合格
3	端板接頭清洗（公及公母單元時）	以大小鋼刷確實清洗	已確認	合格
4	穩定液新鮮液之貯存量是否充裕	依照施工計畫	已確認	合格
5	槽溝穩定液面高度控制	液面在導溝頂下 80 cm 以內；高於地下水位 1.0 m 以上（現場確認）	導溝頂下 60 cm	合格
6	廢土清運是否正常	不致影響挖掘進度	已確認	合格
7	施工動線及運土車輛之安排	不致延遲澆置時間	已確認	合格
8	壁體坍塌處是否需作補強	若需補強，說明方式	已確認	合格
9	帆布是否破損（母單元時）	單元起吊前及下放時檢查	已確認	合格
10	開挖深度與特密管長度之配合	初灌管底離槽溝底 30～50 cm	40 cm	合格
11	特密管之檢查（變形、破裂、堵塞、水密性）	下放前及過程中目視檢查	已確認	合格
12	特密管插入位置、深度、組合記錄	位置符合圖面；長度配合挖掘深度	已確認	合格
13	放置橡皮碗	澆置前放置於漏斗內	已確認	合格

連續壁施工品質自檢總表

工程名稱： Example Construction Project …
施工廠商： ○○營造股份有限公司
施工期間： 2026-08-10 ～ 2026-08-11
填表人： Site Engineer

品質自檢項目（續）

項次	檢查項目	檢查標準	現場紀錄 / 實測	結果
14	穩定液回收池容積是否足夠	同時間無挖掘，容積大於回收量	已確認	合格
15	混凝土坍度之確認	坍度 20 cm；允許誤差 2 cm	20 cm	合格
16	混凝土是否合乎設計強度	實測強度 ≥ 設計強度 350 kgf/cm²	350 kgf/cm²	合格
17	特密管埋入混凝土內之確認	公單元：埋入深度 ≥ 1.5 m	2 m	合格
18	超音波記錄結果說明	垂直壁體偏差 ≤ 1/300（填斜率分母 n，可寫 1/420）	1/420	合格

缺失及改善結果

各項檢查完成，未發現影響施工之缺失。

所長	副所長	擔當者

開挖與前置紀錄

工程名稱： Example Construction Project …
施工廠商： ○○營造股份有限公司
開挖日期： 2026-08-10 ～ 2026-08-11
填表人： Site Engineer

壁體資訊

單元類型	單元編號	順序編號
公單元	21	03
混凝土強度(kgf/cm²)	設計深度(GL,m)	壁厚 / 單元長度(m)
350	GL −35.80 m	1.00 / 2.80
澆置頂端高程(GL,m)	設計澆置高度(m)	設計 / 實際數量(m³) / 差異
GL −0.50	35.30	98.84 / 102.26 / 3.46%

04｜開挖紀錄

開挖日期：2026-08-10 ～ 2026-08-11

出土次數	深度確認	最新深度	與設計差異
3 次	2 次	−35.82 m	−0.02 m

出土紀錄

次數	出土時間
1	08/10 07:40
2	08/10 08:20
3	08/10 09:05

深度確認

次數	確認時間	深度（m）	與設計差異（m）
1	12:10	−35.80	0.00
2	12:35	−35.82	−0.02

05｜前置紀錄時間紀錄

項次	作業項目	作業日期	開始時間	完成時間
1	清沉泥	2026-08-11	08:00	08:30
2	下方鋼筋籠吊放	2026-08-11	09:00	09:30
3	上方鋼筋籠吊放	2026-08-11	10:00	
4	鋼筋籠續接	2026-08-11	11:00	11:30
5	鋼筋籠吊放完成	2026-08-11		12:30
6	特密管施工	2026-08-11	13:00	13:30

跨午夜的時間以 24 時以後接續表示（例：24:20＝翌日 00:20）。

所長	副所長	擔當者

澆置紀錄

工程名稱： **Example Construction Project — North Lot**
施工廠商： **○○營造股份有限公司**
澆置日期： **2026-08-11**
填表人： **Site Engineer**

壁體資訊

單元類型	單元編號	順序編號	混凝土強度(kgf/cm²)	設計深度(GL,m)	壁厚 / 單元長度(m)	澆置頂端高程(GL,m)	設計澆置高度(m)	設計 / 實際數量(m³) / 差異
公單元	21	03	350	GL −35.80 m	1.00 / 2.80	GL −0.50	35.30	98.84 / 102.26 …

澆置主控摘要


車次(車)	逐車累積量(m³)	設計 / 實際數量(m³) / 差異	預估 / 實測 / 差異(m)
8	102.26	98.84 / 102.26 / 3.46%	36.52 / 36.30 / −0.22

逐車混凝土澆置紀錄

車次	車號	出廠	卸料	結束	坍度(cm)	方量(m³)	累積(m³)	預估高(m)	實際高(m)	澆置時間(分)
1	C01	12:28	13:20	13:33	(試1) 18	13.00	13.00	4.64	4.62	65
2	C02	12:50	13:42	13:55		13.00	26.00	9.29	9.26	65
3	C03	13:28	14:20	14:33		13.00	39.00	13.93	13.90	65
4	C04	13:50	14:42	14:55		13.00	52.00	18.57	18.54	65
5	C05	14:28	15:20	15:33		13.00	65.00	23.21	23.18	65
6	C06	14:50	15:42	15:55		13.00	78.00	27.86	27.82	65
7	C07	15:28	16:20	16:33		13.00	91.00	32.50	32.46	65
8	C08	15:50	16:42	16:55		11.26	102.26	36.52	36.30	65

跨午夜的時間以 24 時以後接續表示（例：25:30＝翌日 01:30）；澆置時間＝結束 − 出廠。

澆置高度曲線

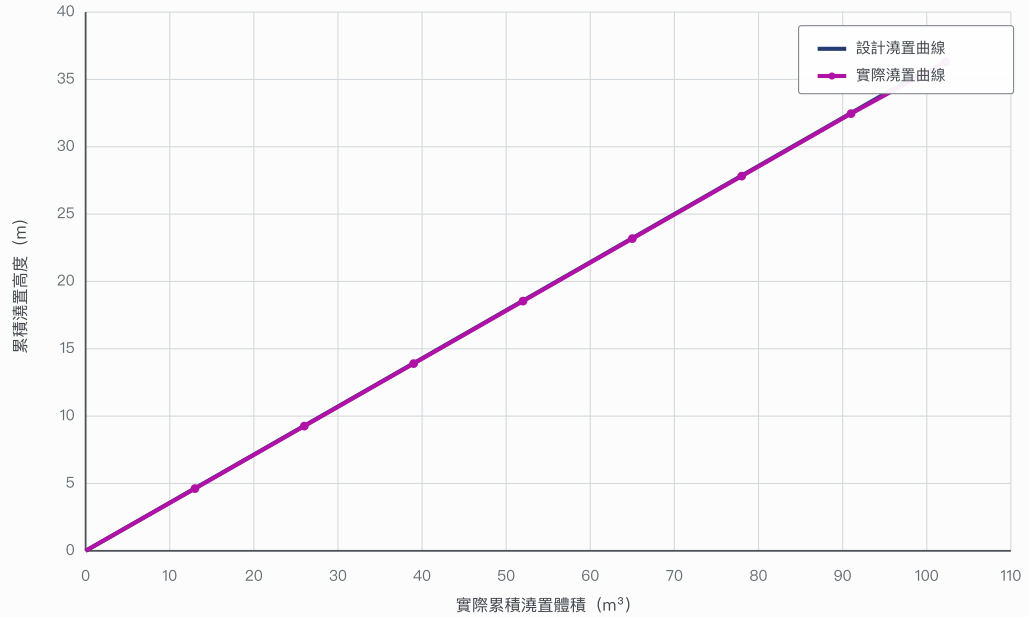

設計線依設計澆置高度與設計數量換算；實際線從原點開始，依每車累積方量與實測累積高度繪製。

所長	副所長	擔當者
